



Warszawa, dnia 03.06.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania numer: D/62/2025 na dostawę prefabrykatów betonowych (prefabrykat ściany oporowej „L”, prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem).

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający - 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę prefabrykatów betonowych (prefabrykat ściany oporowej „L”, prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem), numer: D/62/2025**, w dniu 27.05.2025 r. oraz w dniu 28.05.2025 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnień:

WNIOSEK nr 1 z dnia 27.05.2025 r.

prosiłbym o potwierdzenie bądź sprecyzowanie wymiarów muru oporowego L przesłanego w załączniku i jeżeli posiadają Państwo dokładny rzut wraz ze zbrojeniem proszę o przesłanie w wiadomości zwrotnej. 235 cm - wysokość, 135 cm - długość stopy/podstawy, 100 cm - szerokość, 15 cm - grubość.

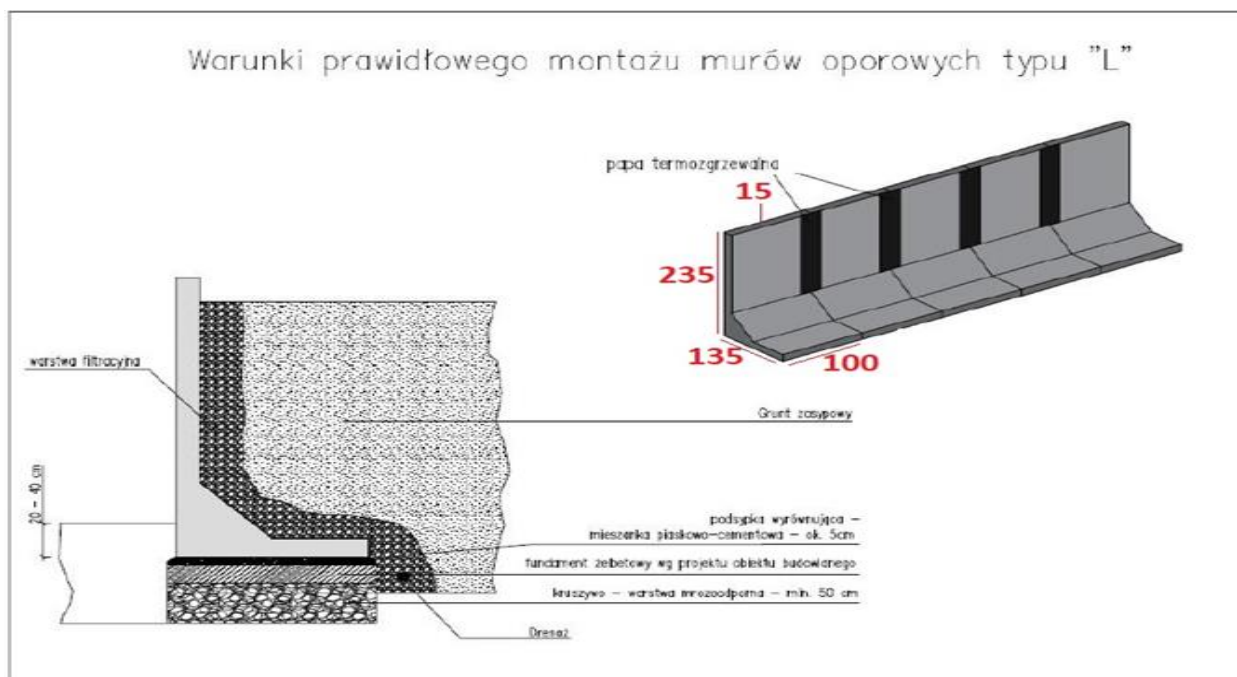

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymiary ściany oporowej „L” mają wynosić:

- wysokość - 235 cm,
- długość stopy/podstawy - 135 cm,
- szerokość prefabrykatu - 100 cm,
- grubość - 15 cm.

Zamawiający informuje również, iż nie precyzuje wymagań dotyczących zbrojenia prefabrykatu - zbrojenie musi być dostosowane do pierwszej klasy obciążenia - do 5 kN/m².

Uproszczony schemat wykorzystania ścian oporowych został przedstawiony w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 03.06.2025r.

W wyniku wyjaśnień Zamawiający dokona stosownych zmian w treści SWZ.

WNIOSEK nr 2 z dnia 28.05.2025 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, chciałbym prosić o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Pytanie 1

1. Czy można zastosować listwy fazujące w prefabrykatach na najdłuższych bokach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż można zastosować listwy fazujące na prefabrykatach płyty ukrycia na najdłuższych bokach.

Pytanie 2

2. Czy jest możliwość zwiększenia haków w płytach z fi 8 na większą średnicę oraz zamianę pręta żebrowanego na pręt gładki celem wzmocnienia mocowania i uniknięcia gięcia haku pod wpływem ciężaru prefabrykatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza się haki montażowe z pręta żebrowanego lub gładkiego. Dopuszcza się średnice pręta od Ø 8 do Ø 14.

Pytanie 3

3. Czy jest możliwość doprecyzowania układu zbrojenia. Jaka dokładnie siatka (jakie oczko) oraz wymiary bigli, otulina?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymiary mają wynosić: otulina minimum 20 mm; zbrojenie: średnica: 12 mm; siatka podwójna, oczko o wymiarach 15x15 cm.

Pytanie 4

4. Która strona płyty ma być szalunkowa, a która zacierana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż strona szalunkowa o wymiarach: 180x250 cm, strona zacierania o wymiarach: 170x250 cm.

Pytanie 5

5. Czy są jakieś specjalne wymagania do betonu? Np odporność na siarczan, wodoszczelność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania do betonu określa załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, ponadto wodoszczelność W8, klasa ekspozycji XF1.

Pytanie 6

6. Prosimy o zamieszczenie rysunków elementów L z kompletnym zbrojeniem, wraz z hakami. Wg. naszej wiedzy, dokumentacja dotycząca tego zakresu nie została zamieszczona w Załączniku nr. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zbrojenie musi zostać zaprojektowane przez Wykonawcę dla obciążenia klasy A 5 kN/m² naziomu. (Rysunek przedstawiony w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 03.06.2025r., zawiera informację, że ściana oporowa ma przenosić obciążenie po obu stronach, w zależności od usytuowania).

W wyniku wyjaśnień Zamawiający dokona stosownych zmian w treści SWZ.

Pytanie 7

7. Co znaczy zapis w elementach L "zbrojenie od zewnątrz".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zbrojenie musi przenosić obciążenie naziomu w 2 wariantach, ciężar od strony podstawy oraz wyższego boku. Zgodnie z załączonym uproszczonym schematem przedstawionym w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 03.06.2025r., (zbrojenie musi zostać zaprojektowane przez Wykonawcę).

W wyniku wyjaśnień Zamawiający dokona stosownych zmian w treści SWZ.

Pytanie 8

8. Jak system przewidziany jest do łączenia prefabrykatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż łączenie prefabrykatów nie jest planowane.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał zmiany zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KOMENDANT

/-/ plk Artur STOPKA
