

Do wszystkich Wykonawców

ZESTAW NR 16 ODPOWIEDZI DO PYTAŃ ZŁOŻONYCH PO TERMINIE

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie kompatybilnych projektów konstrukcji w formacie PDF i DWG. Udostępnione w dniu 23.03.2023r. nie są spójne, brakuje w DWG rysunku K-1.4A, natomiast jest rysunek K-2.1, przywołane rysunki dotyczą ścian żelbetowych parteru, a są odmienne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunek ścian monolitycznych poziomu -1 znajduje się na rysunkach K-1.4a i K2.1a rev.1. Na rysunku K-2.1a rev.1. przedstawiono słupy.

Pytanie nr 2

Proszę o informację gdzie występuje ściana Scw gr.40cm widoczna na rysunku K-2.1A2 w udostępnionym projekcie w dniu 23.03.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że znajduje się przy ścianie Scw i jest usytuowana prostopadle przy osi bD. Ściana ta znajduje się na rysunku K-1.5. Usunięto ją z rysunku K-2.1a rev.1.

Pytanie nr 3


Proszę o informację gdzie występuje słup ściana widoczna na rysunku K-1.5 A0 w udostępnionym projekcie w dniu 23.03.2023 r.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupściana widoczna na rysunku k-1.5A0 znajduje się w osi bD przy osi B2.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, na rysunku K-02 dłuższa ściana szybu żelbetowego wynosi 220cm, z kolei na rzucie K-03 wynosi 210cm. Krótsza na rzucie K-02 wynosi 160cm, natomiast na rysunku K-03 165cm (poniżej szczegół), układ otworów również nie współgra pomiędzy kondygnacjami.

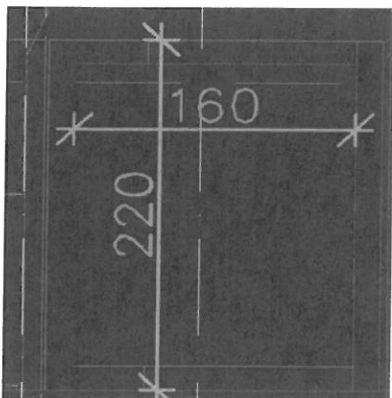

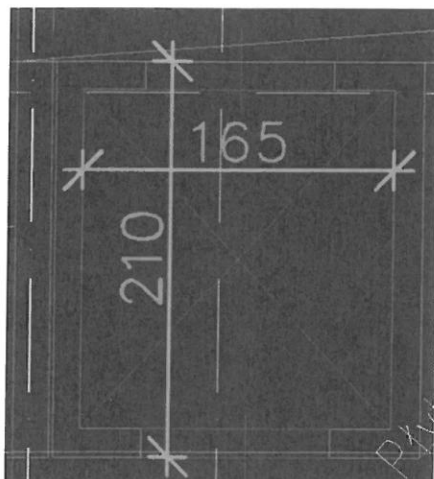

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skorygowano rysunek K-03 rev. 2 (wymiary szyby windowego), na rysunku zbrojeniowym są wymiary są właściwe.

Pytanie nr 5

Proszę o wskazanie gdzie występuje ściana poz. S1.2 gr.25cm z rysunku K-2.1A2 (od poziomu +4,970 do +9,371) – proszę o wskazanie osi, z wcześniejszych rysunków wynika, że jest to ściana poziomu 1 w osi b1/bA-bG, w dokumentacji z dnia 23.03.2023 w tym miejscu występuje ściana 2.1 z rysunku K-1.4A – proszę o wyjaśnienie rozbieżności, gdyż nawet pomiędzy samymi ścianami jest rozbieżność w zakresie otworów w ścianie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściany żelbetowe parteru pokazuje rysunek K-1.4a (ściana S1.2 występuje z nową nazwą S2.1 - zgodnie z rysunkiem K-03 rev.2.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej typu posadzki. Według rzutu wykończenia ścian i posadzek w pomieszczeniach 0.3 i 0.3a jest posadzka P5, natomiast w opisie technicznym do projektu architektury wskazano posadzkę P6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem na rzutach proszę przyjąć posadzkę P5.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej typu posadzki. Według rzutu wykończenia ścian i posadzek w pomieszczeniu 1.3 jest posadzka P2, natomiast w opisie technicznym do projektu architektury wskazano posadzkę P1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 1.3 występuje posadzka P2 zgodnie z rzutami posadzek.



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej typu posadzki. Według rzutu wykończenia ścian i posadzek na schodach 1.6 są posadzki P1/P2, natomiast w opisie technicznym do projektu architektury wskazano posadzkę P1/P4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na schodach 1.6 występuje posadzka P1/P2 zgodnie z rzutami posadzek.

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach stanowią integralną część SWZ z uwzględnieniem zmian, które są ich konsekwencją i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska
